


Departemen Konstruksi 建机处	Catatan Perubahan Desain 设计变更记录表 记录编号/Nomor Rekor: 001/HD/AFI-3		
Nama Proyek 工程名称	GWT 1000吨 印尼Afi公司第三工厂一期自来水蓄水池工程 GWT 1000 Ton Proyek Reservoir Air Bersih Tahap 1 Pabrik III PT Afi Indonesia		
Pabrik 厂区	AFI-3	Kader pengawas 监督干部	Khoirur roziqin
现场记录			
waktu 时间	内容 isi		
2026/3/26	Penjelasan sebagai berikut 说明如下: 1. 由于容量为 1000 吨的 GWT 水池施工位置由 15 号楼后方调整至 7 号楼与 8 号楼之间区域, 导致需要对管道系统进行相应调整, 即新增一条连接管道 (interconnecting pipeline), 用于将水从 1 号水池输送至 2 号水池, 管道长度约为 602.75 米, 采用直径 4 英寸的管道, 以确保水流的连续性并与现有系统实现整合。 Perubahan lokasi pekerjaan kolam GWT kapasitas 1000 ton dari area belakang Gedung 15 ke area antara Gedung 7 dan 8 mengakibatkan perlunya penyesuaian sistem perpipaan, berupa penambahan pipa penghubung (interconnecting pipeline) untuk menyalurkan air dari Kolam 1 ke Kolam 2 sepanjang ±602,75 meter menggunakan pipa berdiameter 4 inci, guna memastikan kontinuitas aliran dan integrasi dengan sistem eksisting. 2. 在进行位置调整之前, 水池设计仍依据原有场地条件进行。待最终位置确定在 7 号楼与 8 号楼之间区域后, 水池设计调整为长方形。该设计变更导致需根据现场条件与实际需求, 对材料数量进行相应调整及增加。 Sebelum dilakukan relokasi, desain kolam masih menyesuaikan kondisi eksisting lokasi. Setelah lokasi final ditetapkan di area antara Gedung 7 dan 8, desain kolam diubah menjadi bentuk persegi panjang. Perubahan desain ini mengakibatkan adanya penyesuaian serta penambahan kuantitas material yang mengikuti kondisi dan kebutuhan di lapangan.		

3. 由于管道线路沿现有排水沟布置（贴附安装），且该区域存在积水风险，因此需要增加管道支撑系统（pipe support），并设置足够的标高，以确保管道始终位于水面以上，避免与积水直接接触，同时保障管道安装的稳定性与可靠性。


Dikarenakan jalur perpipaan dipasang mengikuti (menempel pada) saluran eksisting yang berpotensi tergenang air, maka diperlukan penambahan sistem penyangga (pipe support) dengan elevasi yang memadai untuk menjaga posisi pipa tetap berada di atas muka air, mencegah kontak langsung dengan genangan, serta menjamin stabilitas dan keandalan instalasi perpipaan.



DETAIL DUDUKAN PIPA @2.5M
管道支座详图@2.5M
SKALA 1:500

4. 计划增设不锈钢材质的检修梯，作为水池检查与清理作业的辅助设施，安装至池底，以确保在维护作业过程中操作人员能够安全、稳定且便捷地到达作业位置。

Penambahan tangga akses berbahan stainless steel direncanakan sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan inspeksi dan pembersihan kolam, dengan pemasangan hingga mencapai dasar kolam guna memastikan akses yang aman, stabil, dan mudah dijangkau oleh personel operasional selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.

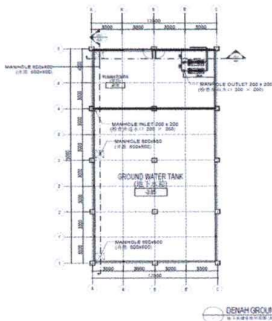

DOCUMENTASI TANGGA STAINLESS (MANHOLE)

建机处/ Departemen Konstruks
直属主管确认

建机处/ Departemen Konstruks
部门主管确认(印尼)

Insinyur yang Bertanggung Jawab
负责工程师

[Signature]

7/5²⁶
