
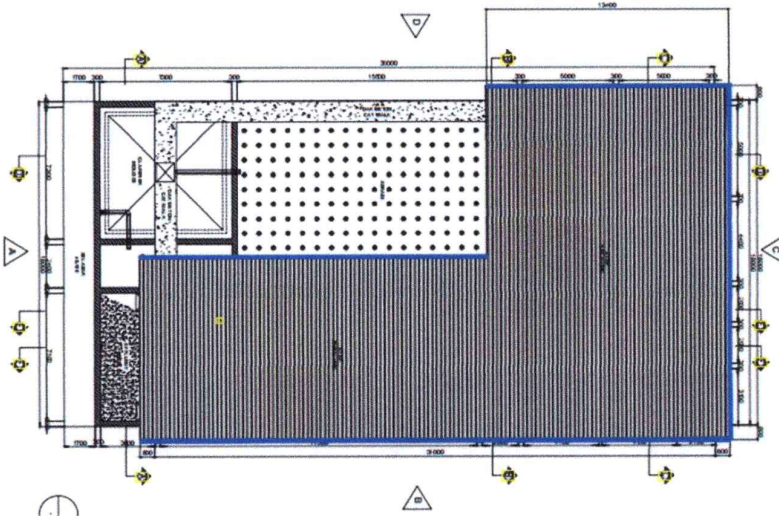


Departemen Konstruksi 建机处		Catatan Perubahan Desain设计 计变更记录表		记录编号/Nomor Rekord : 001/HD/AFI-1	
Nama Proyek 工程名称		工厂工程建设合同 Proyek Peralatan Pengolahan Air Limbah			
Pabrik 厂区	AFI-3	Kader pengawas 监督干部	KHOIRUR ROZIQIN		
现场记录					
waktu 时间	内容 isi				
05/03/2025	Penjelasan sebagai berikut 说明如下： 1. Sehubungan dengan perubahan desain, dilakukan penambahan struktur kanopi pelindung pada area peralatan mekanis dan fasilitas pendukung. Kanopi direncanakan menggunakan struktur rangka baja dengan penutup atap tahan cuaca, yang dipasang pada elevasi dan dimensi yang menyesuaikan tata letak eksisting. Penambahan ini bertujuan untuk meminimalkan paparan langsung terhadap air hujan yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja dan kerusakan peralatan, serta memastikan keberlangsungan operasional. Selain itu, desain ini juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan ruang kerja guna mendukung kegiatan inspeksi, operasi, dan pemeliharaan oleh petugas STP secara aman dan efisien. 鉴于设计变更，在机械设备及配套设施区域增设防雨棚结构。该防雨棚采用钢结构框架及耐候屋面材料，安装标高及尺寸根据现有布局进行调整。此项增设旨在减少设备直接暴露于雨水中的情况，从而避免性能下降及设备损坏，并确保运行的连续性。此外，该设计亦充分考虑了可达性及作业空间，以便STP工作人员能够安全、高效地进行检查、操作及维护工作。 				


17/03/2025

2. Sehubungan dengan perubahan desain, berdasarkan hasil evaluasi teknis diketahui bahwa elevasi sumur pengumpul (inlet STP) lebih tinggi dibandingkan elevasi pipa eksisting, sehingga aliran air limbah domestik tidak dapat mengalir secara gravitasi dengan stabil. Oleh karena itu, direncanakan penambahan satu unit bak penampungan (equalizing tank/sump pit) sebagai fasilitas penampung sementara. Bak penampungan ini berfungsi untuk menyeimbangkan debit aliran, mencegah terjadinya aliran balik (backflow), serta menjaga kontinuitas suplai air limbah menuju sistem STP. Desain bak mempertimbangkan kapasitas tampung, waktu tinggal (retention time), serta dilengkapi sistem pemompaan untuk mengalirkan limbah ke inlet STP sesuai kebutuhan operasional.

鉴于设计变更, 根据技术评估结果, 集水井 (STP 进水口) 标高高于现有管道标高, 导致生活污水无法通过重力实现稳定流动。因此, 计划增设一座集水池 (均衡池/集水坑) 作为临时储存设施。该集水池用于平衡流量、防止倒流 (回流), 并确保污水持续输送至 STP 系统。设计中已综合考虑储存容量、停留时间 (retention time), 并配备抽水系统, 以根据运行需求将污水输送至 STP 进水口。

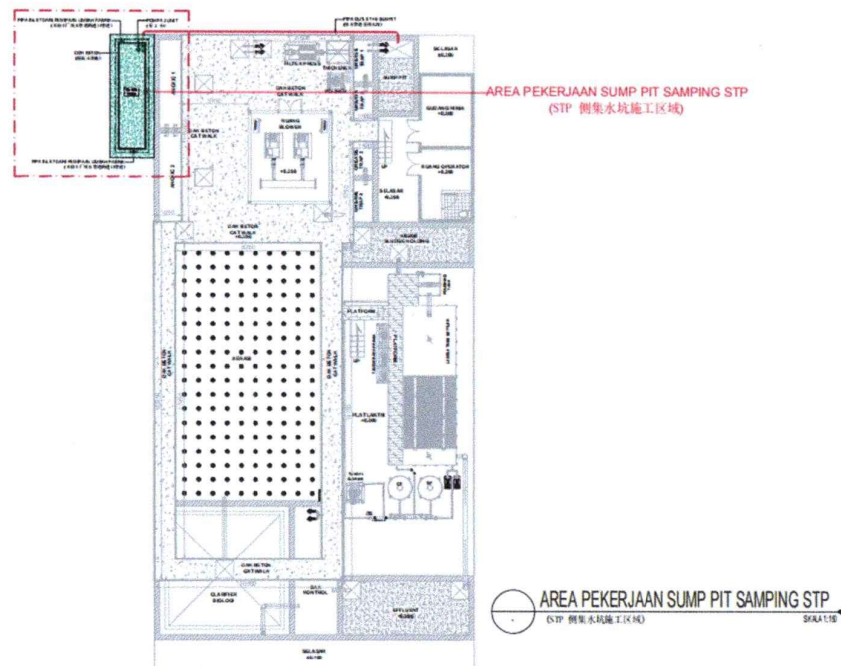

5. Karena area pabrik berada di wilayah pesisir dengan intensitas angin yang tinggi, untuk menghindari tampias air hujan ke dalam area, maka dilakukan penambahan cladding sebagai elemen pelindung.
 由于工厂位于沿海地区，风力较大，为防止雨水被风吹入室内区域，需增设外墙覆层（cladding）作为防护措施。

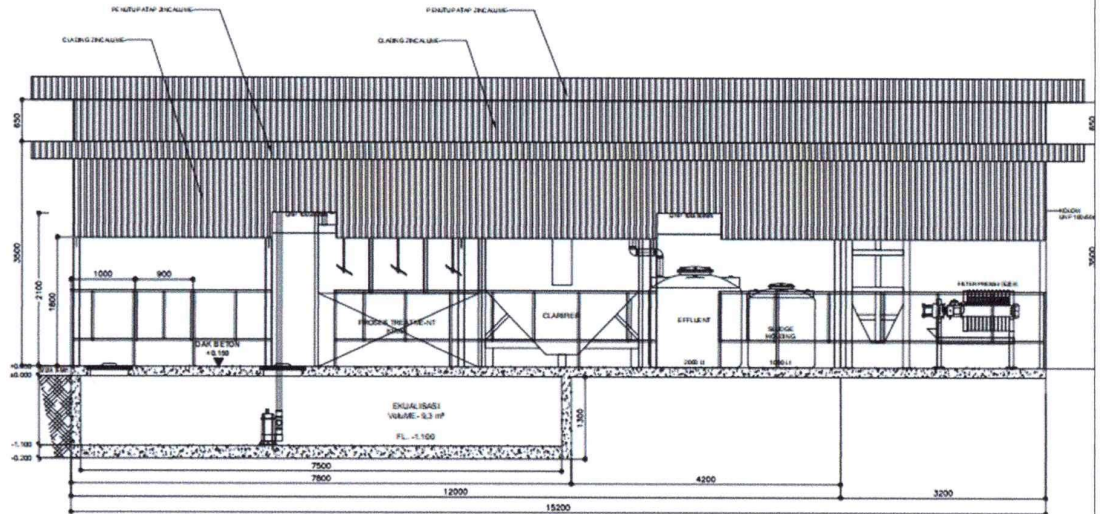

建机处/ Departemen Konstruks 直
属主管确认

建机处/ Departemen Konstruks 部
门主管确认(印尼)

Insinyur yang Bertanggung Jawab 负
责工程师

[Signature]

[Signature] 7/5²⁶
